







# Schlitzrinnen-Bestellblatt






Bauvorhaben	Rinnen-Typ		Klasse
	Rinnen mit Innengefälle siehe Seite 2		RIKI-SLOT-DROP® (OPA)
Angebotsnummer	Auftragsnummer	Bestell-datum	Gewünschter Liefertermin

	Name	Straße	PLZ	Ort
Händler				
Auftraggeber/ Bauunternehmer				
Baustellen- anschrift				

	Name	Telefon/Mobil	Mail
Bauleiter			
Polier			

Bemerkungen	Datum	Unterschrift

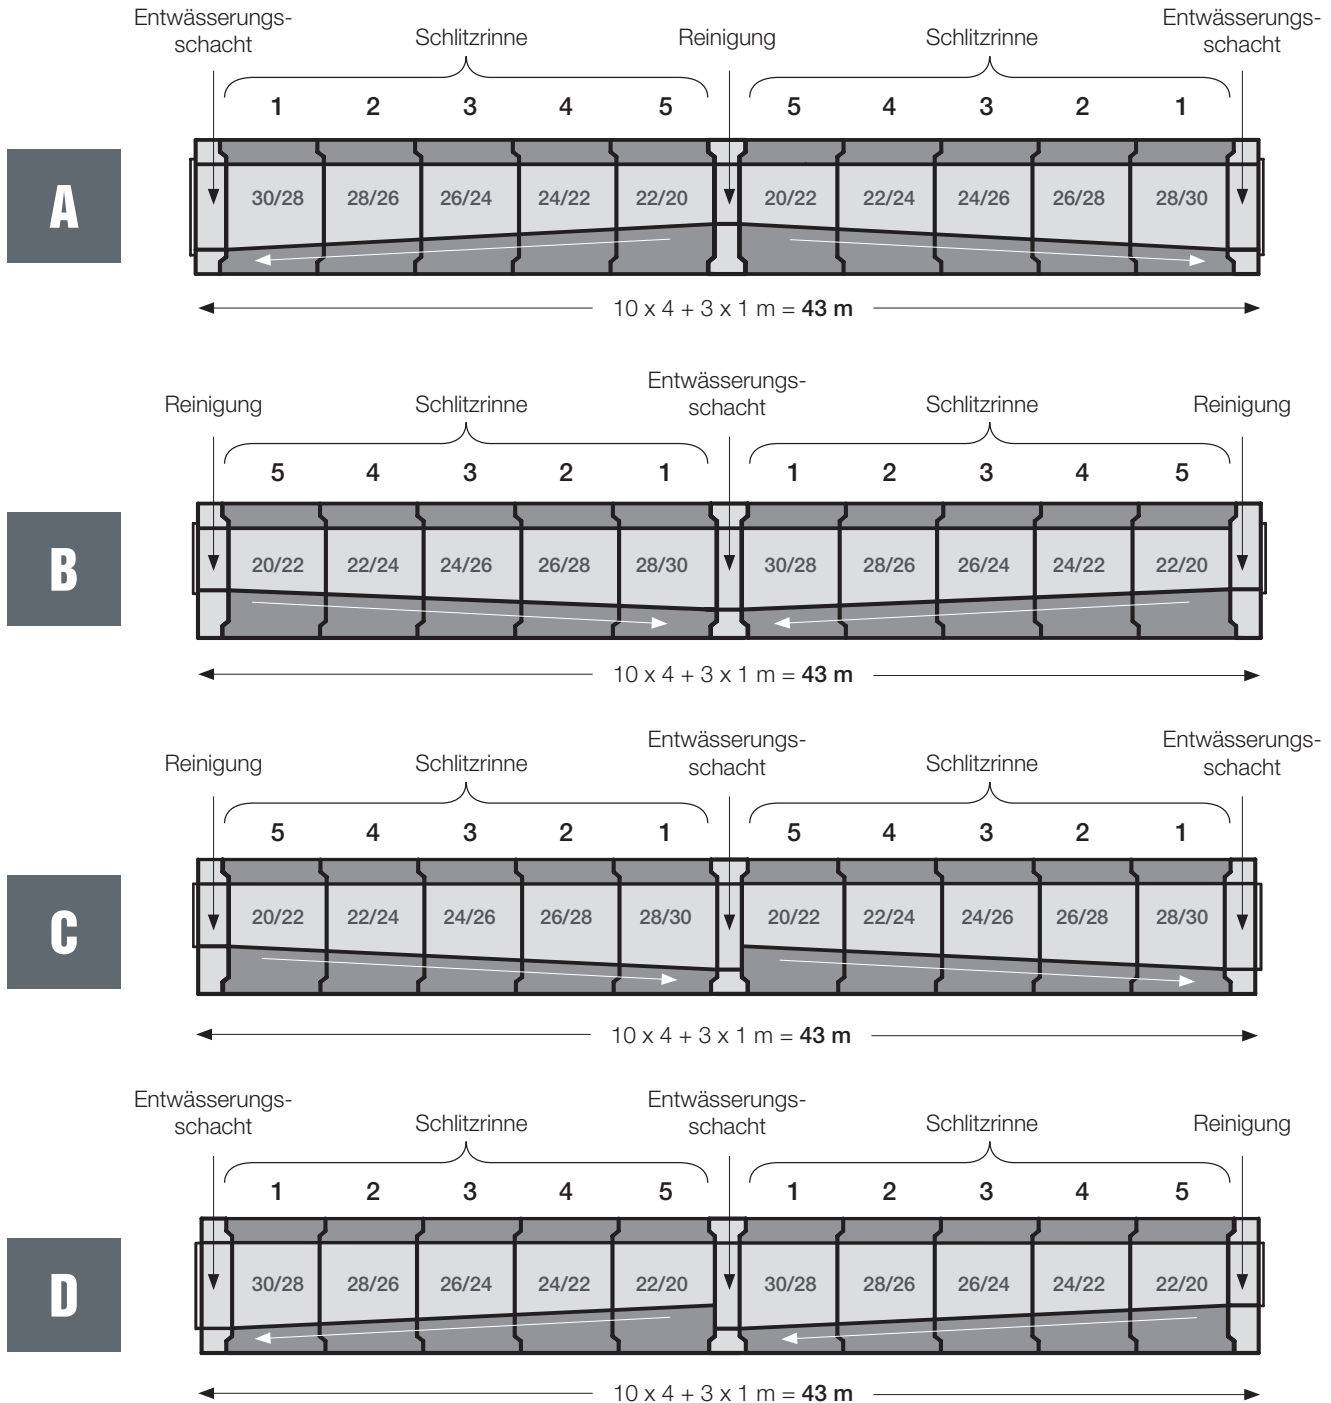
Bezeichnung	Menge/Stk.	Menge/lfm.
Normalrinne l = 4,00 m 		
Entwässerungsschacht l = 1,00 m 		
Reinigungsrinne l = 1,00 m 		
Passrinne bitte Länge angeben 	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
Abschlussplatte Spitzende 		
Abschlussplatte Muffe 		

Bezeichnung	Menge/Stk.
Bodenteil Anschluss PVC 	DN 150
	DN 200
	DN 300
Zwischenring H30 mit Falz für SR20 	
Zwischenring H20 mit Falz für SR20 u. SR20/30 - 32x45 cm 	
Eimer 	
Eimer, schmal für SR20 u. SR20/30 - 32x45 cm 	

Montagematerial	Menge/Stk.
Versetzungshänge	
Gleitmittel 5 kg	
Montagestopp	
Klebeband	
PE-Rundschnur Stärke 1 cm; Rolle = 100 m	

Bauvorhaben				Rinnen-Typ		Klasse	
Angebotsnummer	Autragsnummer			Bestell-datum		Gewünschter Liefertermin	

## Verlegebeispiele für Rinnen mit Innengefälle | SR 20/30 oder SR 30



### Hinweis:

Die Rinnenelemente haben ein eingebautes Innengefälle von 0,5 %. Somit können im Regelfall Haltungslängen bis 43 m entwässert werden. Durch den Einbau von zusätzlichen Rinnen ohne Innengefälle vor dem Schacht können die Haltungen verlängert werden.

Für Nicht-Abbildbare-Stranglösungen ist ein **bauseitiger Verlegeplan** notwendig!
